



B(아+복합트)안동고가 (낙동강 횡단교량) 계측계획도

S=NONE

구분	기호	센서명	구분	기호	센서명	구분	기호	센서명
교량	●	온도계	교량	■	지진계	가시설	㉑	스트럿변형률계
	㉒	풍향풍속계		■	자유장지진계		㉒	스트럿축력계
	+	2축경사계		㉓	신축이음변위계	비탈면	㉔	지중경사계
	+	점적변형율계		㉔	토압계		㉕	지하수위계
	⊙	2축가속도계		㉕	상대변위계		㉖	변위대기
	↓	저침계		가시설	㉖		지중경사계	㉗
▼	케이블장력계		㉗	지하수위계				


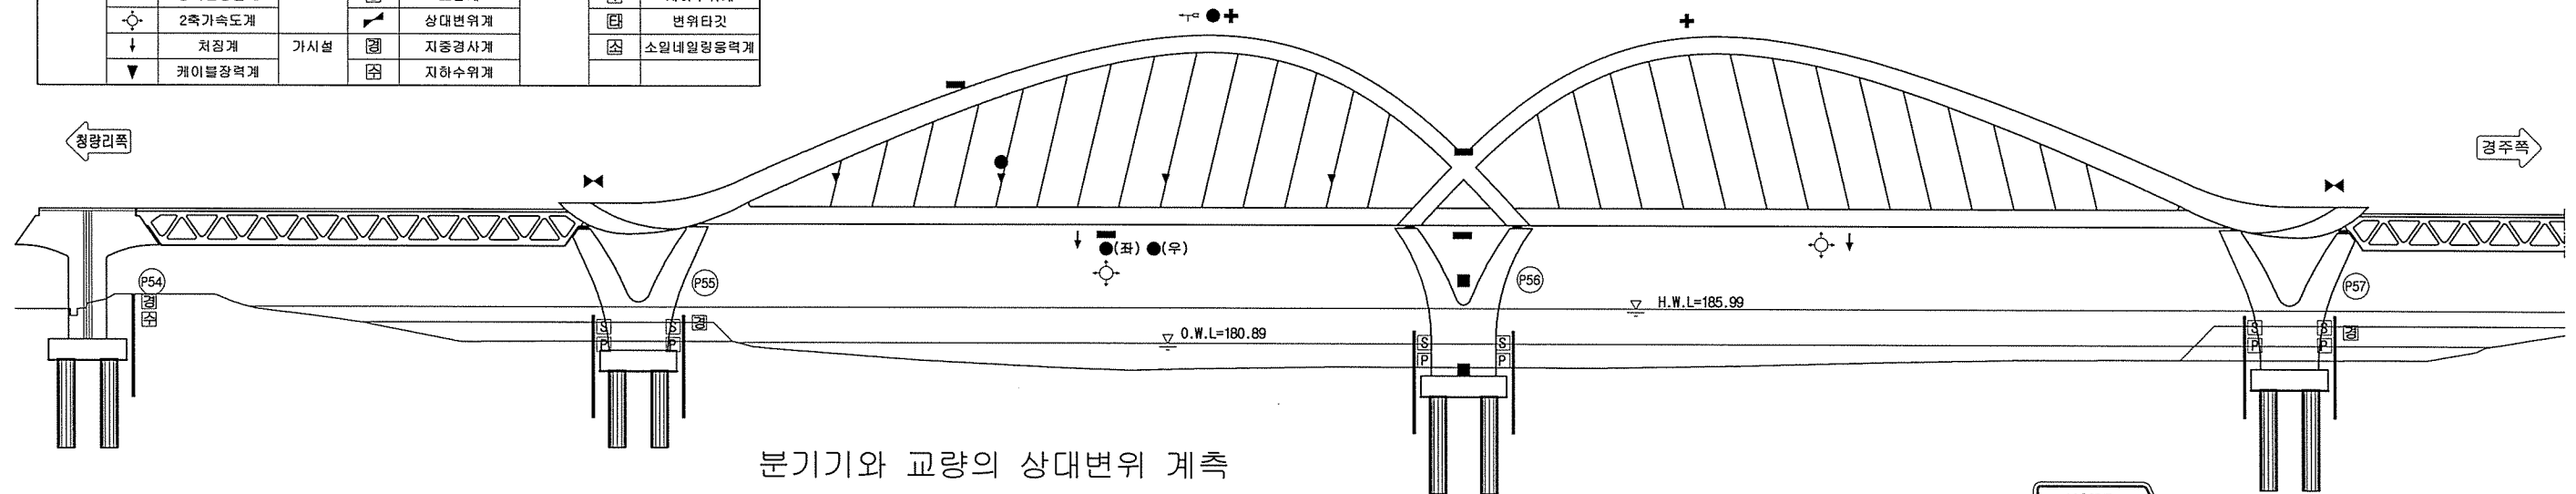


분기기와 교량의 상대변위 계측




국도34호선 시공중계측

자유장 계측

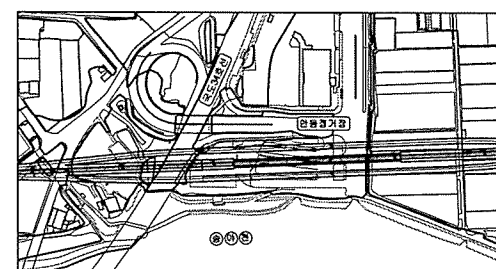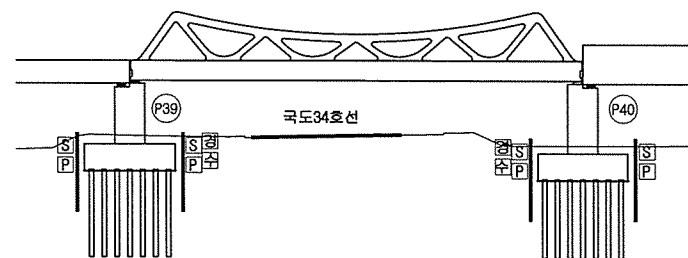

◀▶ 정거장 인근 야산에 자유장지진계 설치

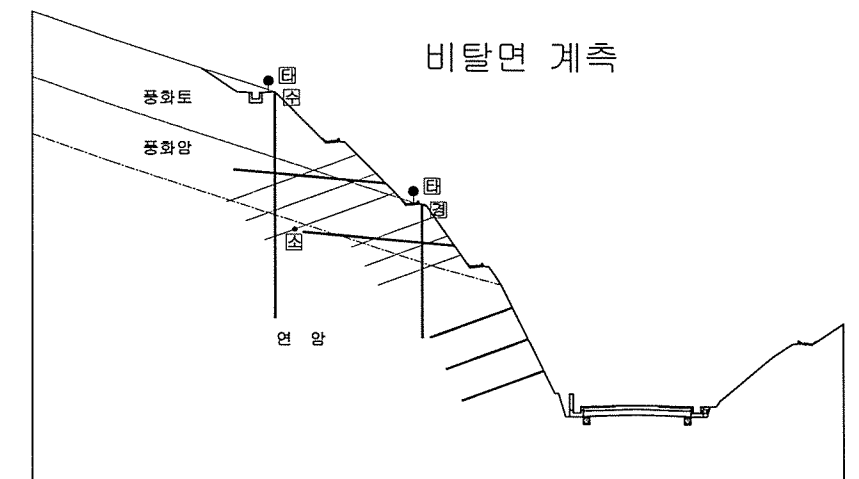


비탈면 계측

NOTE

1. 본 도면은 설계상 필요한 제반치수를 위하여 적용한 것으로 시공시 현장여건을 반영하여 감독자 또는 감독원의 승인을 득한 후 변경가능하다.
2. 교대(A2)에 배면에 토압계 설치

계측시스템 구성도

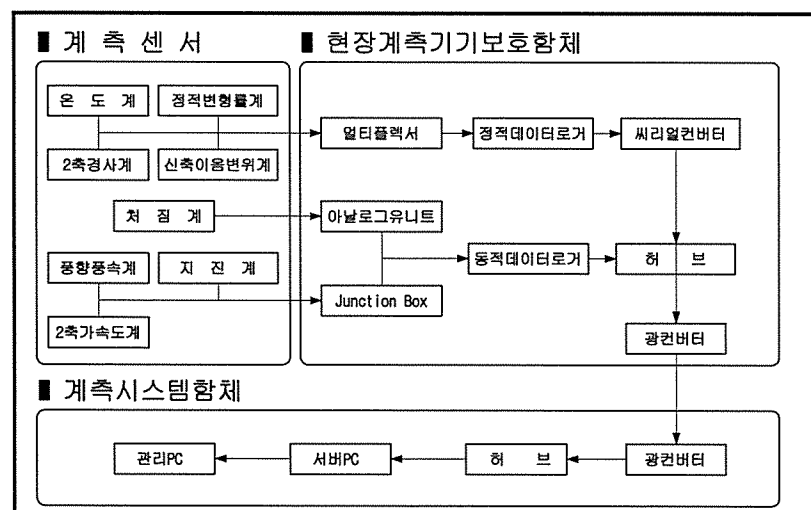

계측항목 및 수량

구분	부재	범례	센서형	계측 방법	부 작 위 치	분 석 항 목	시공종 계측	공정종 계측
아치교	아 치 리 트	● 온도계	정적	아치리브 상단	아치리브의 온도변화	1	이관	1
		중항중속계	동적	아치리브 상단	중항중속측정	1	이관	1
		2축경사계	정적	아치리브 상단	아치리브의 변위측정	2	이관	2
		정적변형율계	정적	아치리브 상단	아치리브의 국부응력변화	2	이관	2
	보강형	● 온도계	정적	경간 1/2지점	보강형의 온도변화	2	이관	2
		2축가속도계	동적	경간 1/2지점	보강형의 진동특성측정	2	이관	2
		치침계	동적	경간 1/2지점	보강형의 처짐변화	2	이관	2
		정적변형율계	정적	경간 1/2지점	보강형 중요부위의 국부응력변화	2	이관	2
	케이블	▼ 케이블장력계	동적	케이블	케이블 장력측정	2	이관	2
		● 온도계	정적	케이블	케이블의 온도변화	1	이관	1
	기 타	■ 지진계	동적	교각부	지진에 의한 진동특성측정	2	이관	2
		자유장지진계	동적	교압구간의 지반운동 대표장소	지반의 지진동특성 측정	2	이관	2
		신축이음변위계	정적	신축이음부	신축이음부의 온도변화에 의한 변위측정	2	이관	2
	토압계	정적	교대 배면	교대 배면의 토압 계측	1	이관	1	
분기교량	상대변위계	정적	바닥판 상면 분기기위치	분기기와 교량의 상대변위 계측	5	이관	5	

구	번	설치 위치	범	센서명	계측 방법	부	착	위	치	관				측	항	목	시공중 계측				
국도34호선	P39 P40		Ⓐ	지중경사계	정적	토류벽	배면	지반		지반의 심도별 변위계측				P39		P40					
			Ⓑ	지하수위계	정적	토류벽	배면	지반		수위와 수압 변동을 측정				1		1					
			Ⓒ	바탕보변형률계	정적	바탕보			부재의 응력측정				1		1						
			Ⓓ	바탕보축력계	정적	바탕보			부재의 응력측정				2		2						
			Ⓔ	바탕보축력계	정적	바탕보			바탕보에 작용하는 축하중 측정				2		2						
남동강철교	P54 ~ P57													P54		P55		P56		P57	
			Ⓐ	지중경사계	정적	토류벽	배면	지반		지반의 심도별 변위계측				1		1		-		1	
			Ⓑ	지하수위계	정적	토류벽	배면	지반		수위와 수압 변동을 측정				1		-		-		-	
			Ⓒ	바탕보변형률계	정적	바탕보			부재의 응력측정				-		2		2		2		
			Ⓓ	바탕보축력계	정적	바탕보			바탕보에 작용하는 축하중 측정				-		2		2		2		
비탈면			Ⓐ	지중경사계	정적	비탈면	지반		지반의 심도별 변위계측				1								
			Ⓑ	지하수위계	정적	비탈면	지반		수위와 수압 변동을 측정				1								
			Ⓒ	변위타기	정적	비탈면	지반		변위 측정				2								
			Ⓓ	소일네일링응력계	정적	소일네일링			소일네일링 응력측정				1								
