계측관리기준

측정항목			계측관리기준치 1차(안전)	계측관리기준치 2차(주의)	계측관리기준치 3차(위험)	관리빈도 굴착중	관리빈도 지하골조 완공 후
지중경사계	일간 변위량	토사	σ = 2mm (7일간)	σ = 4mm (7일간)	σ = 10mm (7일간)	2회/주	1회/주 1개월까지
		암반	σ = 1mm (7일간)	δ ≤ 2mm (1일간)	σ = 4mm (1일간)		
	최대변위량		3차 관리기준×0.6	3차 관리기준×0.8	0.002H (H = 최대굴착깊이)		
지하수위계	일 수위 변화량(ΔH)		ΔH = 0.5m	ΔH = 0.75m	ΔH = 1.0m	1회/일 이상 2회/주	1회/주 1개월까지
	누적지하수위 변화량		누적지하수위 저하량 침투해석 예측값×0.8	누적지하수위 저하량 침투해석 예측값	누적지하수위 저하량 침투해석 예측값×1.2 and 변위 관련 계측 2차 관리기준 초과 시		
변형률계	최대변위량		3차 관리기준×0.6	3차 관리기준×0.8	허용치	2회/주	-
응력계	최대변위량		3차 관리기준×0.6	3차 관리기준×0.8	허용치	2회/주	-
건물경사계	각변위		1/1000	1/850	1/500	2회/주	1회/주 1개월까지
균열측정계	최대변위량		0.2mm	0.38mm	0.5mm	2회/주	
지표침하계	최대변위량		15mm (3차 관리기준×0.6)	20mm (3차 관리기준×0.8)	25mm (허용치)	2회/주	
유량계	지하수 유출량		지하수 유출량 침투해석 예측값×0.8	지하수 유출량 침투해석 예측값	지하수 유출량 침투해석 예측값×1.2 and 변위 관련 계측 2차 관리기준 초과 시	필요시	-

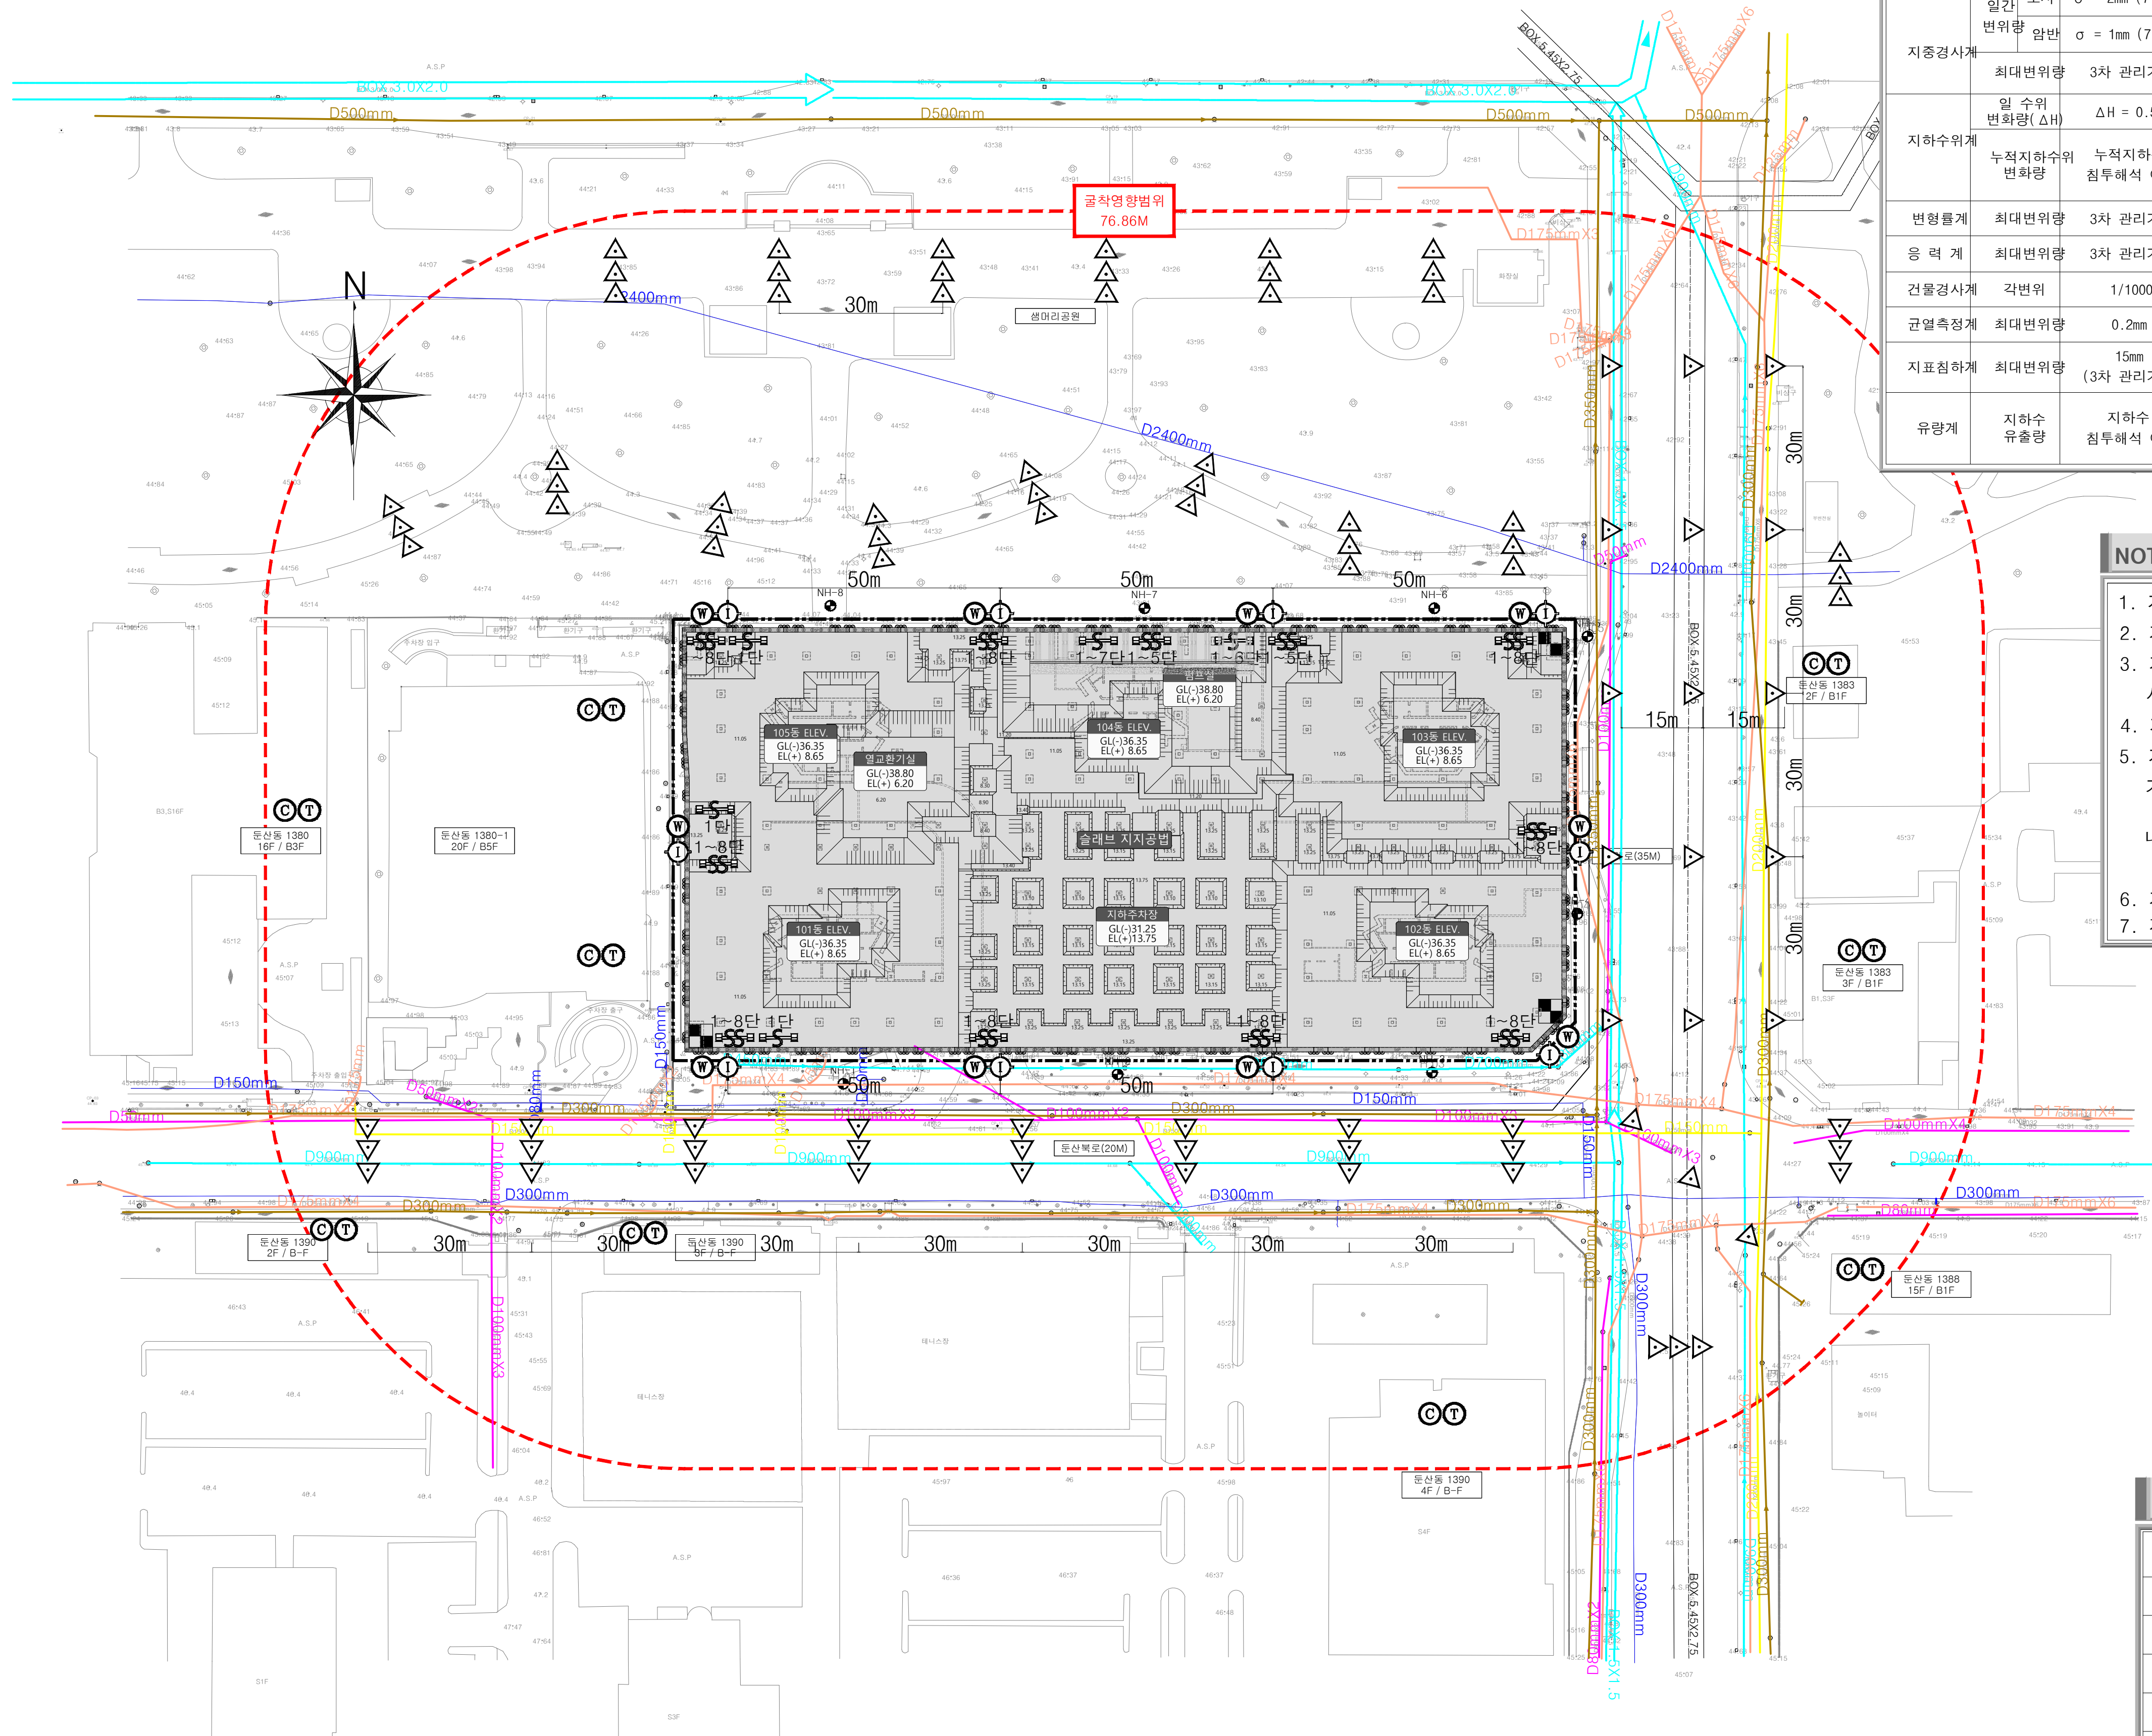

NOTE

1. 계측 계획 수행 계획서를 작성하여 정기적으로 실시한다.
2. 계측보고서는 전문기술자의 검토 승인을 득하여야 한다.
3. 계측 수행은 반드시 계측 전문회사에서 실시하여야 하며 사전에 설계자와 협의하여야 한다.
4. 계측종목 및 수량은 현장시공 상황에 따라 변경할수 있다.
5. 계측 빈도
   가) 안전성이 확보되지 않았다고 판단될때는 공사책임자와 협의 후 수시로 실시한다.
   나) 강우, 장마시, 기타 구조물에 위해 요소가 발생될 우려가 있다고 판단될때는 수시로 실시한다.
6. 계측기간은 터파기 시행시 부터 되메우기 완료시까지로 한다.
7. 지중경사계는 단단한 지층까지 근입하여야 함.

계측범례

구 분	종 류	수 량	비 고
Ⓘ	지중경사계	10EA	
Ⓦ	지하수위계	10EA	
	변형률계	16EA	
	응 력 계	82EA	
▽	지표침하계	31개소(93EA)	
Ⓒ	균열측정계	9EA	
Ⓣ	건물경사계	9EA	
	유 량 계	3EA	

계측계획 평면도

SCALE : 1/700(1,400)

韓國技術士會 No.911350100065 登錄 李 松 技術士 土質및基礎 REGISTERED PROFESSIONAL ENGINEER

설계명 PROJECT TITLE	대전 둔산동 1380-2 일원 오피스텔 신축공사
주기 NOTE	
설계변경 DESCRIPTION OF REVISION	일 자 / 설계 / 검토 / 심사 / 승인
설계 DESIGN	설계사무소명 DRAWING OFFICE NAME: dA architecture group; 건축사명 ARCHITECT NAME: 김 현 호
	설계사무소명 DRAWING OFFICE NAME; 건축사명 ARCHITECT NAME: 김 홍 정
참여기술자 DRAWN BY	
축척 SCALE	A1 1 / 700; A3 1 / 1,400
일 자 DATE	2023. 02.
설계번호 PROJECT NO.	
도면화일명 DWG. FILE NAME	
도면번호 SHEET NO.	C - 116
도면명 SUBJECT TITLE	계측계획 평면도
